


COMUNE DI MISTERBIANCO

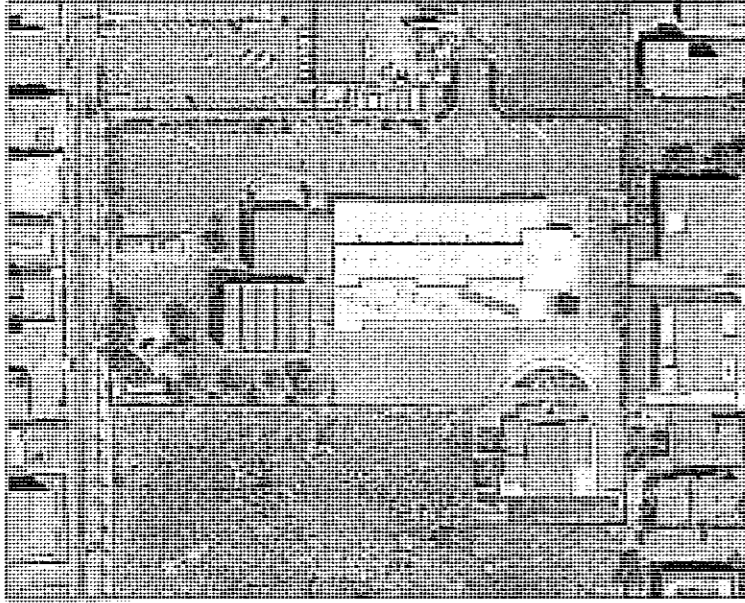

MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "LEONARDO SCIASCIA" PLESSO DI VIA PUGLIA

ALLEGATO: 9

descrizione:

Cronoprogramma dei lavori

pareri:
PARERE FAVOREVOLE IN LINEA TECNICA,
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3 DELLA
L.R. N. 12/2011
PROT. N. 10/2015 DEL - 4 SET. 2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UNICO
Ing. Orlando Vincenzo

elaborazione: dicembre 2014 - agg. settembre 2015

IL COORDINATORE
PER LA SICUREZZA
(geom. Rizzo Francesco)

IL PROGETTISTA
(geom. Stalimbene Sebastiano)

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(ing. Orlando Vincenzo)

	a partire dalla settimana	durata in settimane	durata cantiere
FASI LAVORATIVE			
INCANTIERAMENTO	0	1	1
SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI A RIFIUTO	1	3	4
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO	4	3	7
RICOSTRUZIONI ED INTONACI	7	2	9
OPERE ESTERNE PER ABBATTIMENTO BARRIERE	9	2	11
OPERE DI FINITURA SUI PROSPETTI	11	3	14
FINITUREE COLORITURE OPERE IN FERRO	14	2	16
SMOBILIZZO CANTIERE	16	1	17

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANTT)

